


河源市聚福华新材料科技有限公司柳城镇白石嶂玻璃用石英岩矿矿区生态修复项目阶段性验收意见

1	采矿权人	河源市聚福华新材料科技有限公司
2	矿区位置	东源县柳城镇柳星村
3	工程概况	《河源市聚福华新材料科技有限公司柳城镇白石嶂玻璃用石英岩矿矿区生态修复方案》由广东省岩土工程勘察院有限公司编制。本次申请验收的矿山，矿区面积 0.2675km ² ，生态修复总面积 13.8263 hm ² 。
4	施工过程	生态修复工程从 2025 年 10 月开工至 2025 年 12 月已完成各项工作，通过外运种植土、场地平整、施肥（有机肥、复合肥）、回填植生袋、铺设绿网、植被重建工程（种植乔木、灌木、攀爬植物、撒播草籽及灌木种籽）、附属设施工程（修筑水沟、警示牌）等，阶段性完成了矿山生态修复工作。
5	生态修复任务完成情况	生态修复工程量（外运种植土 5208m ³ ；场地平整 35490m ² ；施有机肥 138t；施复合肥 42t；回填植生袋护坡 22988 袋；种植大叶相思 19352 株；种植三毛豆 23228 株；种植爬山虎 45302 株；撒播草籽 830kg；撒播猪屎豆种子 830kg；挂绿网 179742m ² ；挖水沟 1644m；警示牌 9 块）。 已按要求完成生态修复工程量，土壤检测结果符合相关标准。
6	工程质量认定	生态修复工作已按照方案进行施工，达到阶段验收条件。
7	阶段验收意见	县自然资源局会同县林业局、市生态环境局东源分局等有关部门，组织邀请有关专家，依据生态修复方案、阶段生态修复计划，对该矿山生态修复工作进行验收。经现场检查和查看相关资料，生态修复方案要求完成外运种植土、场地平整、施肥（有机肥、复合肥）、回填植生袋、铺设绿网、植被重建工程（种植乔木、灌木、攀爬植物、撒播草籽及灌木种籽）、附属设施工程（修筑水沟、警示牌）等工作，基本达到阶段生态修复目标要求，后期需持续做好管护工作，定期对矿山植被生长情况进行监测及补种，到管护期结束时达到周边同等地类生产力水平。
8	附件	生态修复红线范围、生态修复现场照片

河源市聚福华新材料科技有限公司柳城镇白石嶂玻璃用石英岩矿`区生态修复航拍图

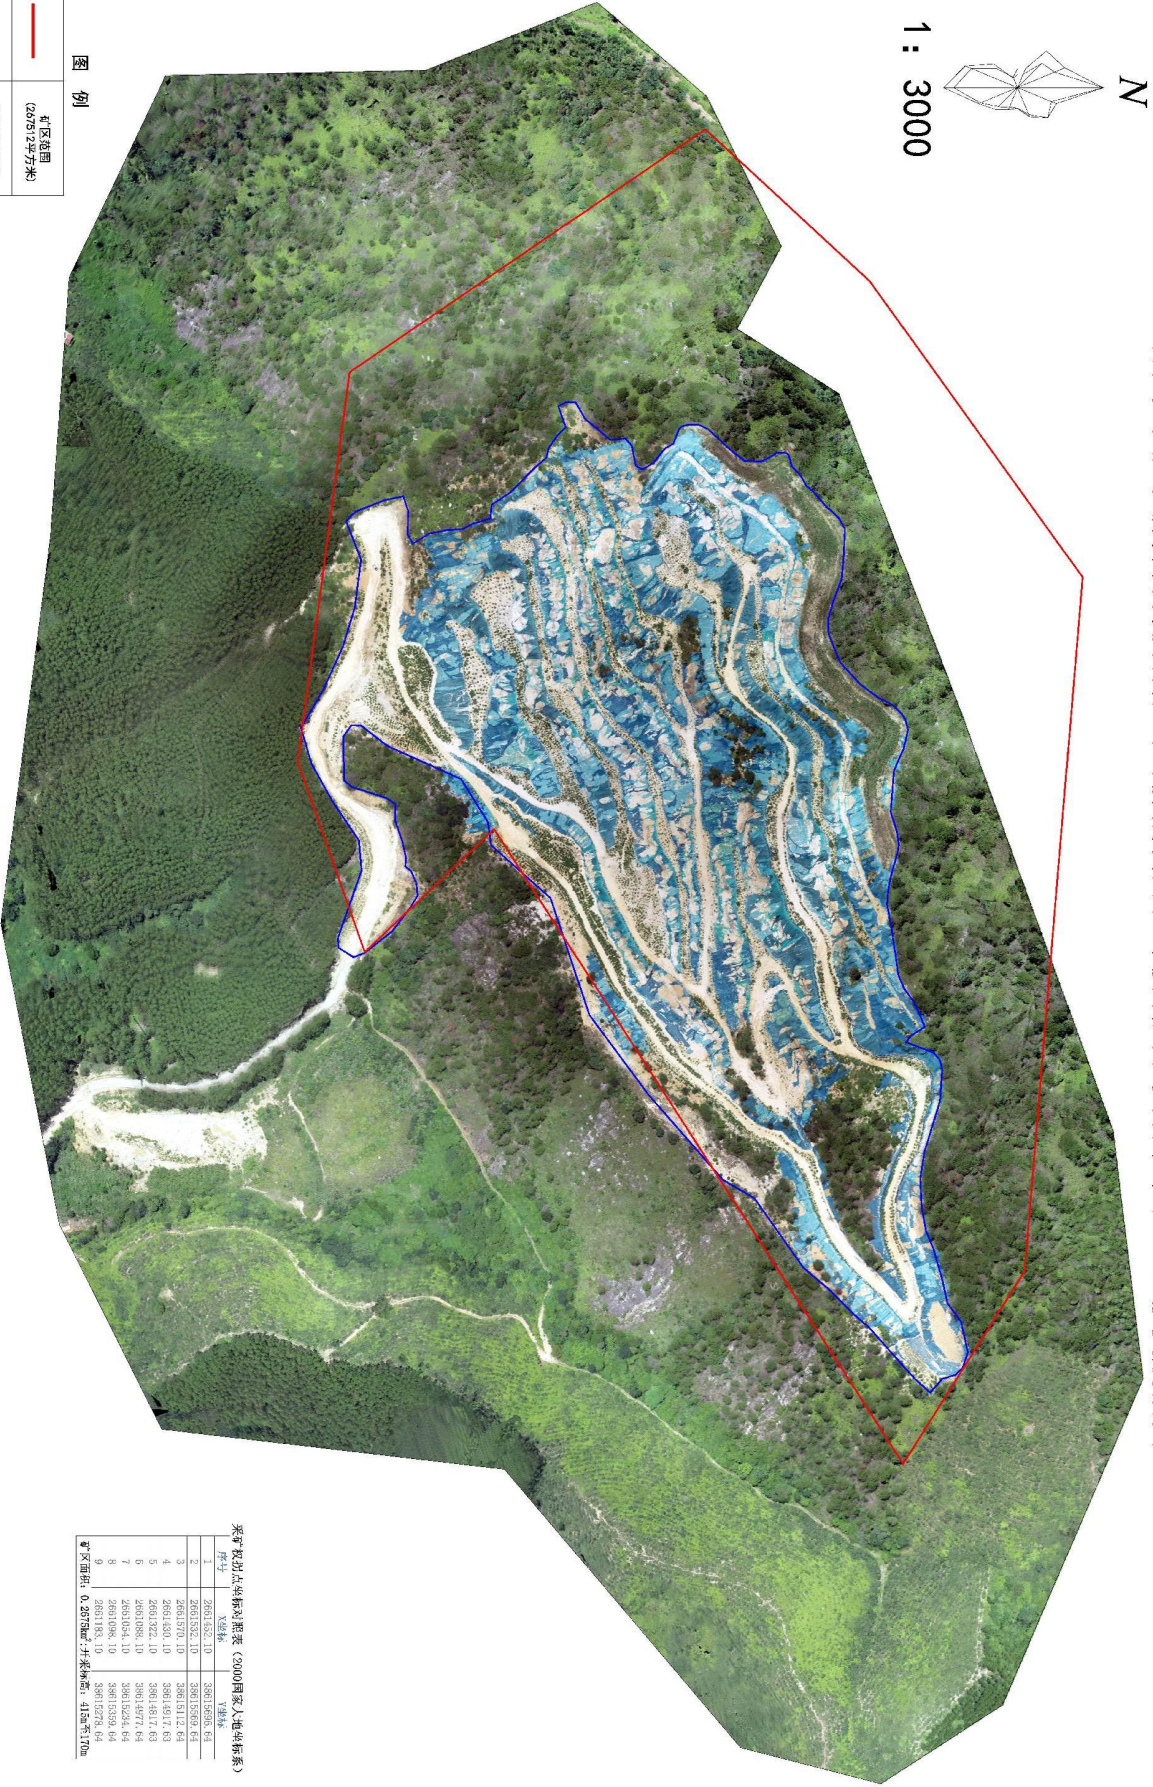

矿区范围 (267512.94平方米)	生态修复范围 (138263平方米)
—	—

图例

碎石场点坐标列表 (2000国家大地坐标系)			
序号	X坐标	Y坐标	
1	2661532.10	39615696.64	
2	2661532.10	39615696.64	
3	2661570.10	39615112.64	
4	2661530.10	39615112.64	
5	2661530.10	39615112.64	
6	2661085.10	39614972.64	
7	2661054.10	39615254.64	
8	2661085.10	39615309.64	
9	2661183.10	39615278.64	
`区面积: 0.2677km²;开采面积: 4125.9170hm²			

坐标系	2000国家大地坐标系	日期	2026年7月25日
采矿权人	河源市聚福华新材料科技有限公司		
施工单位	湖南惠行建设工程有限公司		

一、生态修复红线范围

二、生态修复现场照片：

